




HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI

YATIRIM PROGRAMI

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

RAPORU

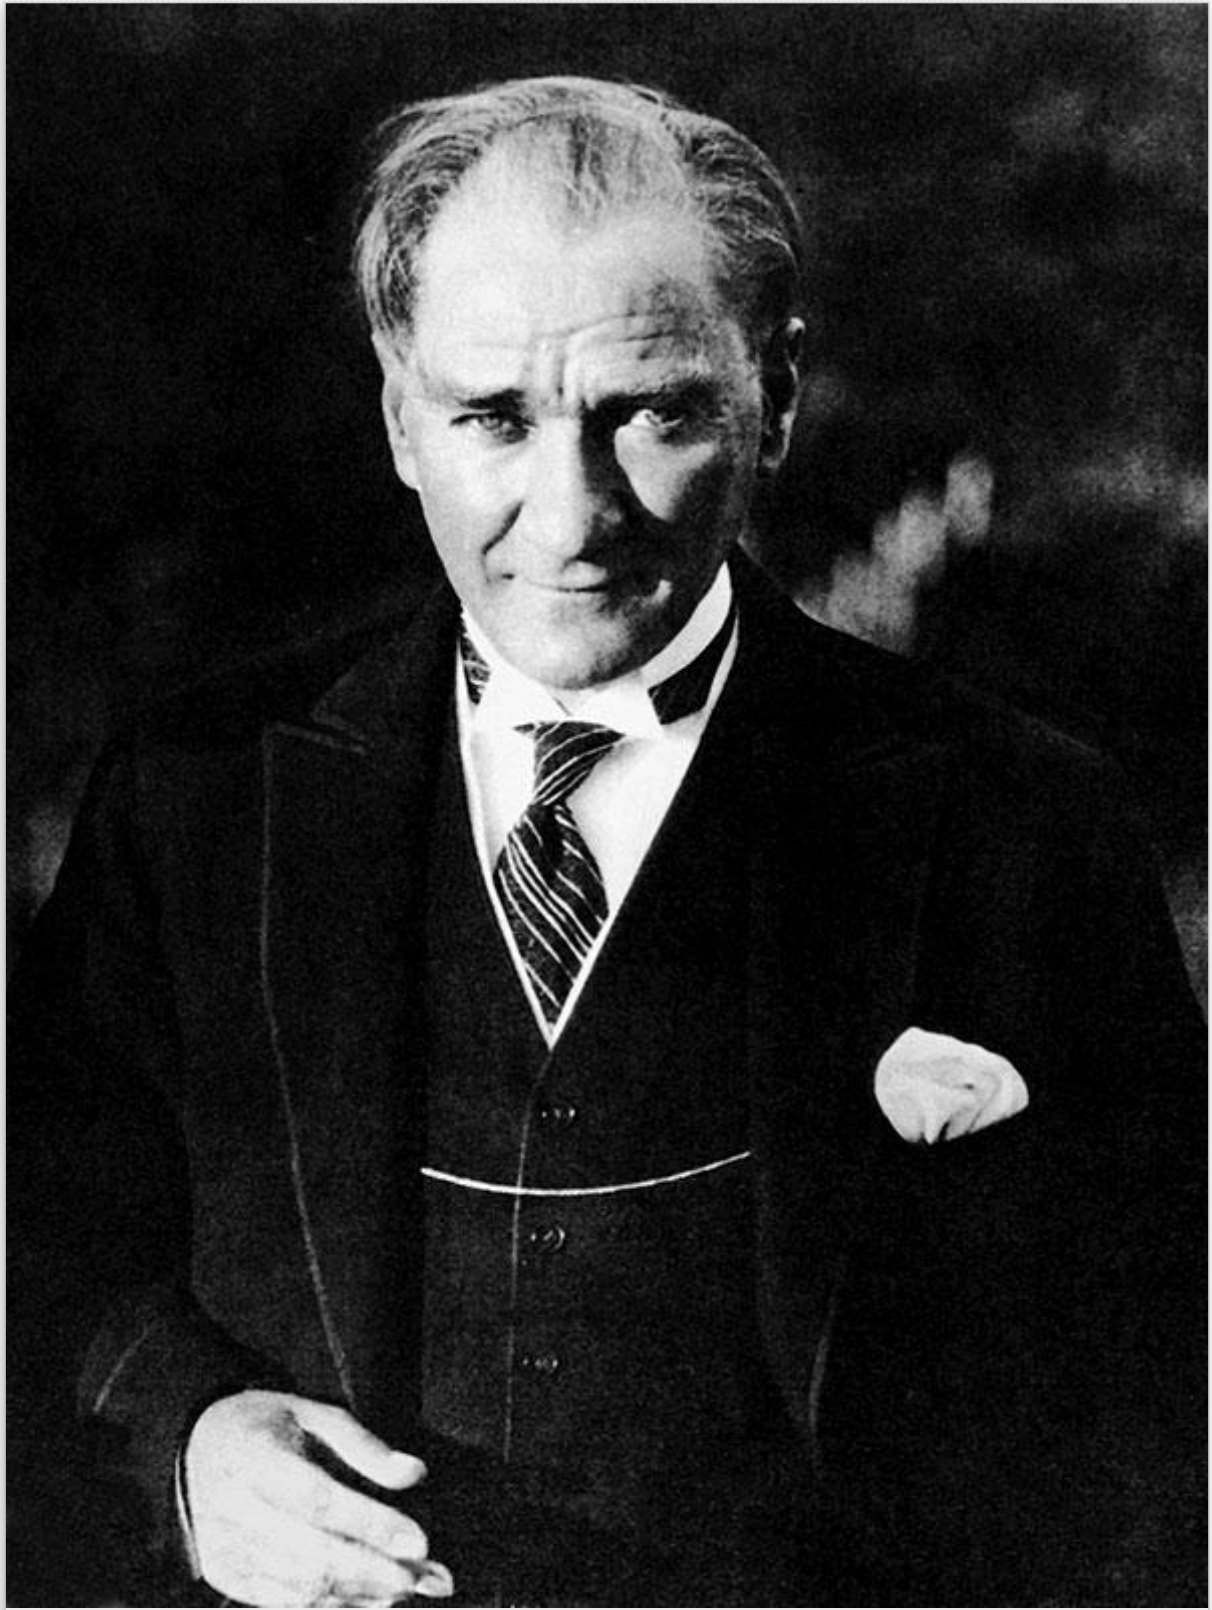

İÇİNDEKİLER

I. GENEL DEĞERLENDİRME	7
1.1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları	7
1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi	7
1.3. 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme	9
1.4. 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları	9
II. 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI	10
2.1. Devam Eden Projeler	10
2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri	10
2014H030130010 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	10
1982H030120 Kampüs Altyapısı	10
2005H031340 Derslik ve Merkezi Birimler	10
2014H030020 Muhtelif İşler	11
2009H031220 Kastamonu Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Blokları	11
1998H050180 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	11
2004H040100 Tarihi Bina Onarımı ve Müstemilat Yapımı	12
2006I000470 Hastaneler Büyük Onarım Projesi	12
2009I000460 Hastane Ek Bina İnşaatı	12
2014I000280 Muhtelif İşler	12
2012I000360 Acil Servis Reorganizasyonu	12
2010I000400 Kastamonu Hastane Onarımı	13
2006K120650 Bilim İnsanı Yetiştirme Programı	13
2009K120770 Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik AR-GE Merkezi	13
2014K120960 Merkezi Araştırma Laboratuvarı	13
2014K120960 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi	13
2.2. Tamamlanan Projeler	14
2.2.1. Tamamlanan Projelerin Listesi	14
2.2.2. Proje Tamamlama Raporu	14
III. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER	14

TABLolar

Tablo 1. Hacettepe Üniversitesi Taşınmazların Dağılımı	8
Tablo 2. Hacettepe Üniversitesi Alanların Dağılımı	9
Tablo 3. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı	9

I. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları

- Özel Bütçe,
- Döner Sermaye

Üniversitemizde eğitim gören 45.384 öğrenciye, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren 3.638 akademik personele, 5.846 idari personele, hastanelerimizden faydalanan hasta ve hasta yakınlarına teknik konularda en iyi şekilde hizmet verebilecek ve kurumumuzun üretkenliğini artıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlayacak;

- Eğitim sektöründe derslik ve amfiler,
- Sağlık sektöründe hastaneler, sağlık merkezleri vb.
- Kültür ve sanat tesisleri,
- Açık ve kapalı spor merkezleri ve
- Çevre ve ulaşım düzenlemeleri yapımları ile

Bunlara yönelik;

- Etüt ve projeler,
- Mevcut tesislerin işletme hizmetleri
- Bakım ve onarım hizmetleri gibi hizmetleri kapsamaktadır.

Tablo 1. Hacettepe Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye/Hazine	Diğer		
Sıhhiye Yerleşkesi	242.046,70	0	31,391,00	273.437,70	332 ada 3 parselde bulunan 31.391 m ² Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Otopark 1994 yılında 49 yıllığına Üniversitemiz adına tahsis edilmiştir.
Beytepe Yerleşkesi	5.236.671,00	388.776,00	0	5.625.447,00	27.592 ada 1 parseldeki 63 m ² ile 27.592 ada 2 parseldeki 10 m ² olmak üzere toplam 73 m ² şahıs hissesi bulunmaktadır. 73 m ² şahıs arazisi alana dahil değildir.
Konservatuvar (Beşevler)	0	22,883,60	0	22,883,60	-
Sosyal Bil. MYO (Opera)	0	3.950,00	0	3.950,00	-
Polatlı	0	0	12,575,00	12,575,00	Üniversitemize ait Polatlı Meslek Yüksekokulu'nun bulunduğu arsa ile üzerinde yer alan binanın mülkiyeti Polatlı Belediyesine ait olup, Üniversitemiz lehine tahsisli bulunmamaktadır.
Bala	0	0	0	0	MEB'den tahsisli olan taşınmaz, tekrar Bakanlığa iade edilmiştir.
FTR Merkezi (Oran)	0	0	2,078,02	2,078,02	Mülkiyeti Türk Eczacılar Birliği'ne ait olup, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi tarafından kiralanmıştır.
Bartın-İnkumu	30,058,87	0	0	30,058,87	-
Elmadağ (Yakupabdal) Kayak Merkezi	50,417,20	0	0	50,417,20	-
Yenimahalle/Alacaatlı Köyü	0	221.581,42	0	221.581,42	-
Mamak/Gülveren	12,176,00	0	0	12,176,00	-
İstanbul	3,487,00	0	0	3,487,00	-
Jandarma Karakolu (Eski)	50.440,00	0	0	50.440,00	Jandarma Genel Komutanlığı'na tahsisli olan taşınmazın mülkiyeti Üniversitemize aittir.
M.S.B./Harita Genel Komutanlığı	395.490,00	0	0	395.490,00	Mülkiyeti Üniversitemize ait olan bölge fiilen M.S.B. tarafından kullanılmaktadır.
Kastamonu	14.374,66	199.241,16	0	213.615,82	Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olup, Üniversitemiz tarafından 03.07.2009 tarihinden itibaren 29 yıllığına kiralanmıştır.
Hatay/İskenderun (Engelliler Reh. Merk.)	0	0	0	0	-
Lodumlu Köyü Mevkii	2.820,00	0	0	2.820,00	Lodumlu Köyü Mevkii, Beytepe Yerleşkemi, Bilkent Üniversitesi Yerleşkesi mevkilerinde yapılan imar planı sonucu artık kadastro parsellerinin toplamını göstermektedir.
Angora Evleri	13.958,00	0	0	13.958,00	-
Bilkent Üniversitesi İçi	8,830,42	0	0	8,830,42	-
Atakum/Samsun	5.320,00	0	0	5.320,00	-
Toplam	6.066.089,85	836.432,18	46.044,02	6.948.566,05	

Tablo 2. Hacettepe Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı

Yerleşke Adı Üniversite	Mülkiyet Durumuna Göre Kapalı Alan (m ²)			Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye/Hazine	Diğer		
Sıhhiye Yerleşkesi	358.471,08	0	0	358.471,08	
Beytepe Yerleşkesi	412.166,58	0	0	412.166,58	
Elmadağ (Yakupabdal) Kayak Merkezi	1.254,00	0	0	1.254,00	
Bartın-İnkumu	1.926,45	0	0	1.926,45	
Konservatuvar (Beşevler)	0	30.064,85	0	30.064,85	
Sosyal Bil. M.Y.O. (Opera)	0	5.874,00	0	5.874,00	
FTR Merkezi (Oran)	0	0	2.908,00	2.908,00	
Polatlı	0	0	6.577,00	6.577,00	
Bala	0	0	0	0	Tahsisli olan taşınmaz Milli Eğitim Bakanlığı'na iade edilmiştir.
Antalya / Manavgat	0	0	9.536,00	9.536,00	
Kastamonu	0	71.161,77	0	71.161,77	
Hatay İskenderun (Engelliler Reh. Merkezi)	0	0	0	0	
Toplam	773.818,11	107.100,62	19.021,00	899.939,73	

Tablo 3. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Hizmet Alanı	Sıhhiye Yerleşkesi	Beytepe Yerleşkesi	Diğer	Toplam
Eğitim	78.938,71	226.332,86	64.226,62	369.498,19
Barınma	37.996,62	77.163,34	3.354,00	118.513,96
Kültür	3.230,00	21.323,00	6.900,00	31.362,00
Sağlık	152.017,97	3.212,60	51.641,00	206.871,57
Beslenme	15.731,04	13.483,00	0	29.214,04
Spor	3.787,10	23.400,00	1.254,00	28.441,10
Diğer (İdari, Tesis, Depo)	66.769,64	47.342,78	1.926,45	116.038,87
Toplam	358.471,08	412.257,58	129.302,07	899.939,73

Üniversitemiz Erişkin, İhsan Doğramacı Çocuk, Onkoloji Hastanesinde toplam 1012 yatak kapasitesi mevcuttur.

1.3. 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme

2014 yılında planlanan acil eylem planının %83'ü gerçekleşmiştir. Ayrıca planın dışında yer alan acil işler de tamamlanmıştır.

1.4. 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları

Genel Yatırım Uygulama Durumu: 2014 yılında Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan projelerin toplam proje tutarı 101.551 Bin TL (77.628 Bin TL Hazine, 16.423 Bin TL Öz gelir, 7.500 Bin TL Döner Sermaye) olarak Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu ödeneye yılı içerisinde toplam 11.448 Bin TL (Hazine) ve 48.716 Bin TL (Öz gelir) ödenek eklenmiş olup, 2014 yılı revize ödenek miktarı 161.715 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin 149.596 Bin TL'si harcanmıştır.

II. 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. Devam eden Projeler

2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri

1. 2014H030010 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje kapsamında 2014 yılında;

- Sıhhiye Yerleşkesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı binasının tadilat edilerek Research Center ve Obezite Merkezi haline dönüştürülmesi için uygulama projelerinin yapılması,
- Beytepe Yerleşkesi imar planı revizyon çalışmasına esas jeolojik ve jeoteknik etüt projesi hazırlanması,
- Beytepe Yerleşkesi alanında yaklaşık 550 Ha. alanda 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı revizyon çalışması yapımı işi,
- Beytepe Yerleşkesi Nüfus Etütleri Enstitüsü uygulama projeleri yapılması,
- Sıhhiye Yerleşkesi, Diş Hekimliği altı mevcut otoparkın zemin katı bir bölümünün tadilatı yapılarak Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı atölyeleri için uygulama projesi hazırlanması işi,
- Sıhhiye Yerleşkesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi yeni kütüphane binası uygulama projeleri yapılması
- Beytepe Yerleşkesi, öğrenci Spor Merkezi uygulama projeleri yapılması işi
- İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi tadilat ve büyük onarım işi kalan kısmı uygulama projeleri yapılması,
- Ankara Devlet Konservatuvarı yeni bina uygulama projeleri yapılması ve ihale dosyası hazırlanması işleri tamamlanmıştır.

Projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği 100 Bin TL (Hazine) olup, projeye 2005H031340 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesinden 217 Bin TL ve **2014H030020** numaralı **Muhtelif İşler** projesinden 118 Bin TL aktarılmış olup, 771 Bin TL arsa satış gelirlerinden eklenmiştir.

Toplam 1.206 Bin TL ödeneğin 1.172 Bin TL'si harcanmıştır.

2. 1982H030120 Kampüs Altyapısı

Proje kapsamında 2014 yılında Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan işler;

Beytepe ve Sıhhiye Yerleşkelerinde bulunan rögarlar ve kontrol hatlarının rutin olarak temizlenmesi işi ile Sıhhiye F2 Blok rögarların yenilenmesi bu proje kapsamında yapılmıştır.

Üniversitemiz yapısal kablolama, aktif ağ ve kablosuz erişim sistemleri geliştirilmiş ve bedelleri ödenmiştir.

Projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği 2.000 Bin TL (Hazine) olup, projeye 2005H031340 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesinden 1.276 Bin TL ve **1998H050180** numaralı **Açık ve Kapalı Spor Tesisleri** projesinden 167 Bin TL aktarılmış olup, 11.458 Bin TL arsa satış gelirlerinden eklenmiş olup, 79 Bin TL **2014H030020** numaralı **Muhtelif İşler** projesine aktarılmıştır.

Toplam 14.822 Bin TL ödeneğin tamamı harcanmıştır.

3. 2005H031340 Derslik ve Merkezi Birimler

Bu proje kapsamında 2012 yılında sözleşmesi imzalanan 20.000 m² alan sahip, Beytepe Yerleşkesi Hukuk Fakültesinin yeni bina inşaatı yapımına başlanmış olup, 5 Katlı (2 BODRUM+ZEMİN+1+2) binanın tüm inşaat işleri bitmiştir. Fiziki gerçekleşme %100 mertebesindedir.

2.625 m² kapalı alana sahip 4 katlı (B+Z+1+2) Gıda Mühendisliği ek bina yapım işi 24.06.2013 tarihinde işe başlanmıştır. Proje tamamlanma aşamasına gelmiştir. Geçici kabul aşamasındadır.

2.930 m² kapalı alana sahip 5 katlı (B+Z+1+2+3) Elektrik Elektronik Mühendisliği, ek bina yapımına 08.07.2013 tarihinde başlanmıştır. Proje tamamlanma aşamasına gelmiştir. Geçici kabul aşamasındadır.

Bu proje kapsamında 2014 yılında sözleşmesi imzalanan 8.020 m² alan sahip, Beytepe Yerleşkesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü 5 katlı bina inşaatı yapımına başlanmış olup, rezerv alan hafriyatına devam etmektedir.

Projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği 17.500 Bin TL (Hazine) olup, projeye Kalkınma Bakanlığından 6.000 Bin TL ek ödenek gelmiş ve 6.588 Bin TL arsa satış gelirlerinden eklenmiş olup, 9.967 Bin TL 2014H030020 numaralı Muhtelif İşler projesine, 1.276 Bin TL 1982H030120 numaralı Kampüs Altyapısı projesine, 217 Bin TL **2014H030010** numaralı **Çeşitli Ünitelerin Etüt** projesine ve 1.400 Bin TL **1998H050180** numaralı **Açık ve Kapalı Spor Tesisleri** projesine aktarılmıştır.

Toplam 17.228 Bin TL ödeneğin 17.222 Bin TL'si harcanmıştır.

4. 2014H030020 Muhtelif İşler

- Beytepe Yerleşkesi muhtelif peyzaj düzenleme işleri
 - Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi prekast merdivenlerinin epoksi zemin kaplama malzemesi ile kaplaması
 - Beytepe ve Sıhhiye Yerleşkelerinde bulunan klima santrallerinde kullanılmak üzere filtre ve kayış alımı
 - Sıhhiye Yerleşkesi, Diş Hekimliği Fakültesi inşaat tadilatı işi
 - Diş Hekimliği Fakültesi 200 KVA UPS alımı
- İşleri bu proje kapsamında tamamlanmıştır.

Bu proje kapsamında 2014 yılı içerisinde Üniversitemiz içerisinde kullanılmakta olan muhtelif mekânların bir program dâhilinde tadilat ve onarımları yaptırılmış olup, ayrıca atölye imkânları ile tadilat, onarım ve işletmesi yapılan mekânlar içinde ihtiyaç duyulan malzeme alımları gerçekleştirilmiştir.

2014 yılı içinde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı için ayrılan bütçeden üretim süreçlerinde kullanılmak suretiyle kısmen veya tamamen değişime uğrayarak yarı mamül veya mamül mal haline gelecek olanlar dışında kalan, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları kapsamında Üniversitemize bağlı bölümlerin merkez ve beytepe olmak üzere ihtiyaçları olan muhtelif malzemeler, büro mobilyaları, mikroskop, tıbbi cihaz alımı, fotokopi ve yazıcılar, akıllı tahta, klima alımı, arşiv dolabı, büro mefruşatı alımı, projeksiyon cihazı alımları, D.M.O'dan alınan muhtelif büro mobilyaları, konpak (arşiv) bilgisayar (monitör ve kasa) büro makinaları alımları yapılmıştır.

2014 yılı içinde Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı için ayrılan bütçeden 49 adet elektronik yayın, 8.834 adet Türkçe basılı yayın, 2.569 adet yabancı dilde basılı yayın alınmıştır. Doğrudan temin yolu ile satın alınan kitap 2.115 adettir. Ayrıca 1.640 adet görsel/işitsel kaynak temini sağlanmıştır. Sermaye giderlerinden karşılanan demirbaş malzeme alımlarının adedi ise 4'tür.

2014 yılı içinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için ayrılan bütçeden Üniversitemiz yapısal kablolama, aktif ağ ve kablosuz erişim sistemleri geliştirilmiş ve birimlerinin yazılım, işletim sistemi, istatistik yazılımı, matematik yazılımı, e-imza yazılımı, 3 boyutlu modelleme programı, anti virüs programları ve lisanslama bedelleri karşılanmıştır.

Projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği 11.896 Bin TL (9.716 Bin TL'si Hazine, 2.180 Bin TL'si Öz gelir) olup, projeye 1998H050180 numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinden 2.633 Bin TL, 2005H031340 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesinden 9.967 Bin TL, 1982H030120 numaralı Kampus Altyapısı projesinden 79 Bin TL ve **2014H040100** numaralı **Tarihi Bina Onarımı ve Müstemilat Yapımı** projesinden 500 Bin TL aktarılmış olup, 5.376 Bin TL Üniversitemiz öz gelirleri ve 3.500 Bin TL Başış gelirlerinden eklenmiş olup, 118 Bin TL **2014H030010** numaralı **Çeşitli Ünitelerin Etüt** projesine aktarılmıştır.

Toplam 33.833 Bin TL ödeneğin 33.703 Bin TL'si harcanmıştır. Bu tutarın 17.795 Bin TL'si büyük onarım, 8.427 Bin TL'si makine-teçhizat alımları, 7.481 Bin TL yayın alımları için kullanılmıştır.

5. 2009H031220 Kastamonu Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Blokları

Projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği 2 Bin TL (Hazine) olup, proje kapsamında yıl içerisinde harcama yapılmamıştır.

6. 1998H050180 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

04.02.2010 tarihinde işe başlanan yaklaşık 20.000 M² kapalı alana sahip 4 katlı (2 Bodrum+Zemin+1. kat) Olimpik Yüzme Havuzu B Bloğu yeni bina yapılması işi fiili olarak %87 'si gerçekleşmiştir.

Projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği 2.800 Bin TL (Hazine) olup, projeye 2005H031340 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesinden 1.400 Bin TL ödenek aktarılmış ve 1.778 Bin TL arsa satış gelirlerinden eklenmiş olup 2.633 Bin TL **2014H030020** numaralı **Muhtelif İşler** projesine ve 167 Bin TL **1982H030120** numaralı **Kampüs Altyapısı** projesine aktarılmıştır.

Toplam 3.178 Bin TL ödeneğin tamamı harcanmıştır.

7. 2004H040100 Tarihi Bina Onarımı ve Müştemilat Yapımı

Projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği 500 Bin TL (Hazine) olup, proje kapsamında 500 Bin TL **2014H030020** numaralı **Muhtelif İşler** projesine aktarılmıştır. Yıl içerisinde harcama yapılmamıştır.

8. 2006I000470 Hastaneler Büyük Onarım Projesi

Bu proje kapsamında, H.Ü. Hastaneleri Tadilat ve Büyük Onarımları işi 14.10.2009 tarihinde işe başlanmıştır. Proje kapsamında 2014 yılında kısaca aşağıdaki işler tamamlanmıştır.

Kadın Hastalıkları ve Kadın Doğum Bloğunda 2. ve 3. katlarda elektrik tesisatı, mekanik tesisatı, ıslak hacimler yenilenmiştir. Döşeme PVC kaplama imalatı ve saç kapı kasaları ile kapı kanatları montajı tamamlandı. Kısacası her iki katın da tüm imatları tamamlanmıştır.

C Katı Uluslararası Hasta Polikliniğinde mekanik tesisat ve elektrik tesisatı imatları ile tüm alt yapı imatları tamamlanmıştır.

Eski Dişçilik Fakültesi zemin katta yapılan Kardiyoloji Bölümündeki elektrik tesisatı, mekanik tesisatı yenilenmiştir. Saten alçı kaplama ve kartonpiyer imalatı tamamlanmıştır. Bölümün tüm imatları tamamlanmıştır. Kadın Hastalıkları ve Kadın Doğum Bloğunun 4. katındaki elektrik tesisat mekanik tesisat ve diğer imatlar tamamlanmıştır.

C Katı Doku Laboratuvarı revize projesine göre mekanik tesisat ve elektrik tesisatı imatları tamamlanmıştır.

Proje Kapsamında Devam Eden İşler

Kadın Hastalıkları ve Kadın Doğum Bloğunun 5. ve 6. katındaki elektrik, mekanik tesisat, duvar sıva ve güçlendirme imatları devam etmektedir.

Projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği 10.000 Bin TL (Hazine) olup, projeye **2012I000360** numaralı **Acil Servis Reorganizasyon** projesinden 5.889 Bin TL ödenek aktarılmış ve 4.775 Bin TL arsa satış gelirlerinden eklenmiş olup 4.000 Bin TL **2014I000280** numaralı **Muhtelif İşler** projesine aktarılmıştır.

Toplam 16.664 Bin TL ödeneğin 16.663 Bin TL'si harcanmıştır.

9. 2009I000460 Hastane Ek Bina İnşaatı

Projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği 1 Bin TL (Hazine) ve 1.000 Bin TL (Döner Sermaye) olup, proje kapsamında yıl içerisinde harcama yapılmamıştır.

10. 2014I000280 Muhtelif İşler

Üniversitemiz Hastanelerinde kullanılmakta olan Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinin bakım onarımları yapılmıştır. Ayrıca kullanılmakta olan telefon santrallerinin ve asansörlerin periyodik bakım ve onarım işlemleri ile tıbbi cihazların bakım onarımı gerçekleştirilmiştir.

Projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği 5.500 Bin TL (Döner Sermaye) olup, projeye 2006I000470 numaralı Hastaneler Büyük Onarım projesinden 4.000 Bin TL, **2012I000360** numaralı **Acil Servis Reorganizasyon** projesinden 1.785 Bin TL ödenek aktarılmış, 500 Bin TL Kalkınma Bakanlığından ek ödenek gelmiş ve 974 Bin TL arsa satış gelirlerinden eklenmiştir.

Toplam 12.759 Bin TL (7.259 Bin TL Hazine, 5.500 Bin TL Döner Sermaye) ödeneğin 6.871 Bin TL'si harcanmıştır.

11. 2012I000360 Acil Servis Reorganizasyonu

Proje kapsamında Erişkin Hastanesi Acil servisinin alt yapısını yenilemek ve geliştirmek, yoğun bakım ünitesi yatak artırarak tıbbi ekipmanları teknolojiye uygun biçimde yenilemek amacıyla inşaat

alanı 12.000 m² 4 katlı binadan oluşacak olan Acil Servis Reorganizasyon işine 21.11.2012 tarihinde başlanmıştır.

İnşaatin tüm katları çıkılarak dış ve iç duvarlar örülmüş ve çatı imalatı tamamlanmış olup, iç duvarlarda sıva imatları devam etmektedir.

- 1) Dış cephe traverten kaplama imalatı devam ediyor.
- 2) Mekanik tesisat devam ediyor.
- 3) Bodrum rampa ve jeneratör odası imalatı devam ediyor.
- 4) Islak hacim seramik imalatı devam ediyor.
- 5) Asma tavan içi sıvası devam ediyor.
- 6) Elektrik tesisatı kablolarının çekilme işi devam ediyor.
- 7) Havalandırma tesisatı devam ediyor.
- 8) Pendant montajı devam ediyor.

Aynı proje kapsamında H.Ü. Acil Servis Reorganizasyon binasına 3 Adet 1250 Kva jeneratörün senkronizasyon ve çıkış panosu, remote radyatör, eksoz tankı ile birlikte montajı ve kurulması işi tamamlanmıştır.

Projenin fiziki gerçekleştirme mertebesi 86% seviyesindedir.

Projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği 21.000 Bin TL (Hazine) olup, projeye 4.000 Bin TL Kalkınma Bakanlığından ek ödenek gelmiş olup, 1.785 Bin TL **20141000280** numaralı **Muhtelif İşler** projesine ve 5.890 Bin TL **20061000470** numaralı **Hastaneler Büyük Onarım** projesine aktarılmıştır.

Toplam 17.325 Bin TL ödeneğin 17.184 Bin TL'si harcanmıştır.

12. 20101000400 Kastamonu Hastane Onarımı

Projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği 1.999 Bin TL (Hazine) 1.000 Bin TL (Döner Sermaye olup, projeye 948 Bin TL Kalkınma Bakanlığından ek ödenek gelmiştir.

Toplam 3.947 Bin TL (2.947 Bin TL Hazine, 1.000 Bin TL Döner Sermaye) ödeneğin 2.946 Bin TL'si harcanmıştır.

13. 2006K120650 Bilim İnsanı Yetiştirme Programı

Projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği 1.000 Bin TL'dir. Programda 30 mezun olmak üzere halen devam eden 37 ÖYP araştırma görevlisi bulunmaktadır. 2014 yılında ÖYP komisyonu tarafından 30 yurt dışı, 11 yurt içi olmak üzere toplam 41 araştırma görevlisi için 144 Bin TL bütçe kullanılmıştır. H.Ü. ÖYP uygulama yönergesine göre 6245 sayılı harcama kanununa göre en az 6 ay olmak üzere uzun süreli yurt dışı seyahati kapsamında 2013-2014 tarihlerinde görevlendirilen "10 Araştırma Görevlisi" için toplam 329 Bin TL ödeme yapılmıştır. 2014 yılında ÖYP komisyonu tarafından 11 bilimsel araştırma projesi toplam 221 Bin TL bütçe ile desteklenmiştir. ÖYP Koordinatörlüğü ihtiyaçları için (kırtasiye, bilgisayar, yazıcı vs.) toplam 205 Bin TL harcanmıştır. 2014 yılında yurtiçi / yurtdışı seyahat, proje ve ofis harcamaları için toplam 899 Bin TL harcanmıştır. Soruşturma kapsamında bulunduğu için 2012 yılında kapatılamayan 180 Bin TL. 2014 yılında 2 araştırma görevlisi dışında tüm işlemler tamamlanarak 125 Bin TL avans kapatılmıştır.

14. 2009K120770 Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik AR-GE Merkezi

Projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği 10 Bin TL olup, ödeneğin tamamı proje özel hesabına aktarılmış olup, 806 Bin TL harcanmıştır.

15. 2014K120960 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği 11.000 Bin TL olup, ödeneğin tamamı proje özel hesabına aktarılmış olup, 792 Bin TL harcanmıştır.

16. 2014K120960 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği 14.243 Bin TL (14.243 Bin TL' si Özgelir) olup, yıl içerisinde 13.496 Bin TL eklenmiş ve toplam 27.739 Bin TL ödeneğin tamamı proje özel hesabına aktarılmış olup, 33.338 Bin TL harcanmıştır.

Ayrıca 2014 yılında Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetimi Projesi kapsamında Kamu İhale Kurumundan 150 Bin TL ödenek, gelir kaydedilerek proje özel hesabına aktarılmıştır.

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

III. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER
